





RKPS 2025

RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL

KELOMPOK TANI HUTAN (KTH)
WONO DADI LESTARI
Desa Jenggrik
Kecamatan Kedunggalar
Kabupaten Ngawi
Provinsi Jawa Timur

KELOMPOK TANI HUTAN (KTH)
WONO DADI LESTARI
DESA JENGGRIK, KECAMATAN KEDUNGGALAR,
KABUPATEN NGAWI

RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
PERIODE 2025 SAMPAI 2034

Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm	
Nomor	: 11617
Tanggal	: 25 September 2024
Nama LPHD/Kelompok/Gapoktan/Koperasi	: KTH Wono Dadi Lestari

Lokasi	
Desa	: Jenggrik
Kecamatan	: Kedunggalar
Kabupaten	: Ngawi
Provinsi	: Jawa Timur
DAS	: Solo
Luas	: ± 151 Ha

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
BALAI PERHTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH JAWA
Alamat : Jl, Boyong No 9, Kaliurang, Hargobinangun Kec Pakem, Kabupaten Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 Email : bpskl.jawa@gmail.com

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
PERIODE 2025 SAMPAI 2034

Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm

Nomor : 11617 Tahun 2024
Tanggal : 25 September 2024
Nama : KTH Wono Dadi Lestari

Lokasi
Desa : Jenggrik
Kecamatan : Kedunggalar
Kabupaten : Ngawi
Provinsi : Jawa Timur
DAS : Solo
Luas : ± 151 (Seratus Lima Puluh Satu) Hektare

Ngawi, 10 Maret 2025
Disusun Oleh
Ketua KTH Wono Dadi Lestari

Katijo

No. Pengesahan : 17/B/03/2025
Tgl. Pengesahan : 24 Maret 2025

No. Penilaian : 500.4.7.11/279.6/123.6.2/2025
Tgl. Penilaian : 13 Maret 2025

Disahkan Oleh:
Kepala Balai PSKL
Wilayah Jawa

Danang Kuncara, S.Hut., M.E.
NIP 197512211999031003

Dinilai Oleh:
Kepala Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah Madiun

Dwijo Saputro, S.Hut., M.P.
NIP 198103132010011031

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK adalah pemberian akses legal Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, atau HTR pada kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi sesuai dengan fungsinya.

Dalam pelaksanaanya kelompok perhutanan sosial wajib melaksanakan penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) yaitu kegiatan yang memuat rencana penguatan kelembagaan, rencana Pemanfaatan Hutan, rencana kerja usaha, dan rencana monitoring dan evaluasi, RKPS merupakan sebuah dokumen penting guna memberikan panduan dalam pengelolaan hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, RKPS ini juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Melakukan identifikasi kebutuhan usaha perhutanan sosial memegang peranan penting dalam pelaksanakan penyusunan RKPS perhutanan sosial pada areal KHDPK. Sedangkan Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah penjabaran detail dan tata waktu pelaksanaan dari dokumen RKPS untuk setiap tahun. Penyusunan RKPS untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan penyusunan RKT untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana perhutanan sosial disusun dengan memperhatikan kearifan lokal, potensi hutan, peluang pasar dan aspek pengarusutamaan gender serta mempertimbangkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang. RKPS memuat gambaran umum, rencana kegiatan dan peta rencana kelola. Gambaran umum memuat informasi :

1. Letak lokasi yang didasarkan batas administrasi dan fungsi kawasan;
2. Keadaan fisik wilayah, meliputi kondisi tutupan lahan, topografi, kelerengan, ketinggian, dan jenis pohon dominan;
3. Keadaan sosial ekonomi, meliputi demografi kependudukan, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur, wilayah; dan
4. Potensi Kawasan.

2. Dasar Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan adalah :

1. Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan ProduksiPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus.

3. Sejarah Usaha Pemanfaatan

Masyarakat Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi sudah Dari dulu menggantungkan ekonominya dari kawasan hutan yang berada di Desa Jenggrik, sebab lokasi Desa Jenggrik Langsung bersebelahan dari kawasan hutan produksi yang berada di bawah KPH Ngawi dan Mayoritas di Warga dari Desa Jenggrik Menjadi Pesanggem di wilayah kerjanya perum perhutani, sehingga memang sejak lama masyarakat dan kawasan hutan itu sendiri saling melengkapi untuk kebutuhan hidup

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Transformasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.7460/MENLHK/PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019 tanggal 16 September 2019

tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) antara Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (MPSDH) Wono Dadi Lestari dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi seluas ± 154,4 (seratus lima puluh empat dan empat persepuluh) hektare pada kawasan Hutan Produksi (HP) di Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur menjadi Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Hutan Wono Dadi Lestari seluas ± 151 (seratus lima puluh satu) hektare, berada dalam kawasan Hutan Produksi Tetap berada dalam Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur untuk 185 (seratus delapan puluh lima) Kepala Keluarga terdiri dari laki-laki sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) orang dan perempuan sebanyak 14 (empat belas) orang

4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) Ini adalah untuk Menyusun rencana kegiatan Pengelolaan Hutan pada Areal Perhutanan Sosial wilayah kerja KTH Wono Dadi Lestari dalam jangka waktu sepuluh (10) tahun yang menyesuaikan dengan potensi areal yang dapat di manfaatkan dan areal yag di lindungi, sehingga pembangunan kehutanan yang berada di Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar terlaksana sesuai dengan perundangan yang berlaku.

BAB II
GAMBARAN UMUM

1. Letak Lokasi

Secara geografis lokasi Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Kth Wono Dadi Lestari terletak di antara -7.389910° Lintang Selatan dan 111.332384° Bujur Timur Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, areal tersebut berada di Jenggrik Kecamatan kedunggalar Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Batas wilayah administrasi areal kelola KTH Wono Dadi Lestari adalah sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kedunggalar dan Bangunrejo Kidul Kecamatan kedunggalar, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Banjarbanggi Kecamatan Pitu, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kawu dan Wonokerto Kecamatan Kedunggalar. Areal Kelola Kawasan Hutan KTH Wono dadi lestari merupakan hutan Produksi dibawah BKPH Kedungglar KPH Ngawi. Secara terperinci batas areal kelola sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 1. Letak Lokasi

No	Uraian	Keterangan
1.	Luas (Ha)	± 151
2.	Letak	
	a. Geografis	-7.389910° Lintang Selatan dan 111.332384° Bujur Timur
	b. Kelompok Hutan	Hutan Produksi
	c. Administrasi pemerintahan	Provinsi Jawa Timur
		Kabupaten Ngawi
		Kecamatan Kedunggalar
		Desa Jenggrik
	d. Batas Areal	• Sebelah Utara Desa Banjarbanggi

		• Sebelah Selatan Desa Bangunrejo Kidul • Sebelah Timur Desa Kawu • Sebelah Barat Desa Banjarbanggi

2. Keadaan Fisik Wilayah

a. Tutupan Lahan

Areal Kelola KTH Wono Dadi Lestari berada pada Kawasan Hutan Produksi dengan dengan rincian sebagai berikut.:

Tabel 2. Tutupan Lahan

No	Uraian	Luas (Ha)	Persen (%)
1.	Hutan Primer	-	-
2.	Hutan Sekunder	16	30,5
3.	Belukar Tua	-	-
4.	Belukar Muda	-	-
5.	Hutan Tanaman	±120	92
6.	Lahan Terbuka	-	-
7.	Tubuh Air	±15	28,5
Jumlah :		±151	100

Sumber : Data identifikasi tutupan Lahan Perum Perhutani KPH Ngawi



Gambar 1. Areal Kelola KTH Wono dadi Lestari

b. Topografi

Topografi areal Kelola KTH Wono Dadi Lestari berada di dataran yang relatif rendah dengan rincian sebanyak 80% berada di kelas lereng Datar (dengan kelerengan 0-8%), 15% berada pada kelas lereng Landai dengan kelerengan 9-15%, dan sebanyak 5% kelas lereng agak curam

Tabel 3. Topografi

No	Kelas Lereng	Kelerengan (%)	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Datar (A)	0 – 8	78,6	80
2	Landai (B)	9 – 15	14,55	15
3	Agak Curam (C)	16 – 25	4,85	5
4	Curam (D)	26 – 40		
5	Sangat Curam (E)	>40		

Sumber : Web Survei Geologi USGS 2022



Gambar 2. Areal Kelola KTH Wono Dadi Lestari

c. Ketinggian Tempat

Areal Kelola KTH Wono Dadi lestari berada di Dataran Rendah dengan seluruh areal berada pada ketinggian 180 mdpl atau seluruhnya berada di range ketinggian 0 sampai 500 Mdpl

Tabel 4. Ketinggian Tempat

No	Kelas Ketinggian (m dpl)	Keterangan	
		Ha	%
1	0 - 500	± 180	100
2	501 - 1000	0	0
3	>1000	-	-
Jumlah :		± 180	100

Sumber : Peta Kontur RBI 2022

d. Pembagian Ruang Kelola

Areal kelola KTH Wono Dadi Lestari seluruhnya merupakan Kawasan Hutan Produksi. Pembagian ruang kelola dibagi menjadi ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan. Ruang Pemanfaatan seluas ± 133 Ha sedangkan ruan perlindungan seluas ± 38 Ha. Ruang Perlindungan merupakan Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Sungai.

Tabel 5. Pembagian Ruang Kelola

No	Luas Ruang Pelindungan (Ha)		Luas Ruang Pemanfaatan (Ha)	
	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Lindung
1	38	-	133	-

Sumber : Identifikasi potensii dan pemetaan Wilayah Kelola KTH Wono Dadi Lestari bersama tim CDK Wilayah Madiun

e. Kondisi Vegetasi

Potensi pohon di areal kelola hutan kemasyarakatan KTH Wono Dadi lestari i berupa tegakan Jati kurang lebih 70 %, Selain itu terdapat tegakan mahoni sekitar 19.5% dan Akasia 10,5%.

Tabel 6. Kondisi Vegetasi

No	Kategori Pohon	Jenis Pohon	Ha	Persen (%)
1	Pohon Dominan	Jati	± 92	70
2	Pohon Lainnya (bisa disebutkan sampai 3 jenis pohon)	Mahoni, Acasia, Sukun	± 24	30

Sumber : Identifikasi potensii dan pemetaan Wilayah Kelola KTH Wono Dadi Lestari bersama tim CDK Wilayah Madiun

3. Sosial ekonomi

a. Demografi

Secara demografi jumlah penduduk Desa Jenggrik sebanyak 8.070 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.058 orang dan Perempuan 4.012 orang. Secara kelas umur Sebagian besar berada pada kelas angkatan kerja dengan rentang umur 15-54 tahun yaitu sebanyak 6.639 orang. dari segi mata pencaharian penduduk Desa Jenggrik didominasi oleh sektor pertanian yaitu sebesar 30.2%, dapat dilihat dari table dibawah ini :

Tabel 7. Demografi

No	Uraian	Satuan	Desa Jenggrik	Jumlah Total	Ket.
1	Jumlah Penduduk				
	Total :	org	8.070	8.070	
	- Laki-Laki	org	4.058	4.058	

	- Perempuan	org	4.012	4.012	
2	-Anak-anak < 15 Tahun	org	570	570	
	-Angkatan kerja 15-54 Tahun	org	6.250	6.250	
	-Angkatan Tidak Produktif <55 Tahun	org	1.431	1.431	
3	Mata Pencaharian				
	• Pertanian	%	30.25	30.25	Rata-Rata
	• Industri Pengolahan	%	0	0	Rata-Rata
	• Jasa Listrik, Gas dan Air	%	0	0	Rata-Rata
	• Jasa Kontruksi dan Bangunan	%	0	0	Rata-Rata
	• Perdagangan	%	0,85	0.85	Rata-Rata
	• Perhubungan dan Angkutan	%	0,10	0,10	Rata-Rata
	• Jasa Lainnya	%	61,15	61,15	Rata-Rata

Sumber : Data Monografi Desa Jenggrik

b. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana Pendidikan di Desa Jenggrik yaitu TK sebanyak 2 unit dan SD sebanyak 4 unit. Tidak terdapat sarana Pendidikan setingkat SMP dan SMA di Desa Jenggrik.

Tabel 8. Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Uraian	Satuan	Desa Jenggrik	Jumlah Total	Ket.
1	• TK Negeri/Swasta				
	- Sekolah	Unit	2	2	
	- Guru	Org	6	6	
	- Murid	Org	70	70	
2	• SD Negeri/Swasta				
	- Sekolah	Unit	4	4	
	- Guru	Org	28	28	
	- Murid	Org	280	280	
3	• SMP/MTs Negeri/Swasta				
	- Sekolah	Unit	-	-	
	- Guru	Org	-	-	
	- Murid	Org	-	-	
4	• SMA/SMK/MA Negeri/Swasta				

No	Uraian	Satuan	Desa Jenggrik	Jumlah Total	Ket.
	- Sekolah	Unit	-	-	
	- Guru	Org	-	-	
	- Murid	Org	-	-	

Sumber : Data Monografi Desa Jenggrik

C. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana Kesehatan di Desa Jenggrik berupa Polindes sebanyak 1 (satu) unit dan Posyandu sebanyak 4 (lima) unit dengan tenaga kesehatan yaitu Bidan sebanyak 1 (satu) orang.

Tabel 9. Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Desa Jenggrik	Jumlah Total	Ket.
1	Sarana Prasarana				
	- Rumah Sakit	Unit	-	-	
	- Puskesmas	Unit	-	-	
	- Polindes	Unit	1	1	
	- Posyandu	Unit	4	4	
2	Tenaga Kesehatan				
	- Medis	Org	-	-	
	- Bidan/Mantri	Org	3	3	
	- Non perawatan	Org	-	-	
	- Apoteker	Org	-	-	
	- Sarana Kesehatan Lainnya	Org	-	-	

Sumber : Data Monografi Desa Jenggrik

D. Untuk sarana peribadatan di Desa Jenggrik terdapat masjid sebanyak 3 unit.

Tabel 10. Sarana dan Prasarana Peribadatan

No	Uraian	Satuan	Desa Jenggrik	Jumlah Total	Ket.
1	Mesjid	Unit	5	5	
2	Surau	Unit	25	25	
3	Gereja	Unit	-		

4	Vihara	Unit	-		

Sumber : Data Monografi Desa Jenggrik

4. Aksesibilitas/Infrastruktur

Aksesibilitas ke Lokasi HKm KTH Wono Dadi lestari dapat ditempuh melalui jalur darat sejauh 4 KM dari Ibukota Kecamatan dengan kondisi jalan baik sejauh 4 km.



Gambar 3. Dokumentasi Aksesibilitas ke Lokasi KTH Wono Dadi Lestari

5. Potensi Kawasan

Areal kelola Kawasan Hutan dari KTH Wono Dadi Lestari hampir seluruhnya berada di kawasan Hutan Produksi dan sedikit di Kawasan Perlindungan setempat (KPS) sehingga memiliki potensi pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana tabel beriku :.

Tabel 11. Potensi Kawasan

No	Kategori	Jenis Potensi	Keterangan
1	Hasil Hutan Kayu	Jati, Mahoni Acasia	Untuk tanaman jati Tersebar di petak

			44,45 dan Mahoni di petak 48 jumlah total luasan 117 Ha sedangakan untuk tanaman akasia berada di petak 45 masuk dalam katagori TLKR tanaman kayu lain rusak dengan total luasan 3.2 Ha
2	Hasil Hutan Bukan Kayu	• Padi • Jagung • Kedelai • Ketela Pohon ,	Tearsebar di petak 44, 45 dan 48 Dengan total luasan 20,19 Ha
3	Jasa Lingkungan	Wisata Alam Jenggrik	Rencana akan di bangun oleh KTH dan Desa melalui PKS



Gambar 4. Dokumentasi tanaman Padi



Gambar 5. Dokumentasi tanaman Jagung

BAB III

PENGELOLAAN SEBELUM RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL

1. Realisasi Kegiatan Konservasi, Perlidungan dan Pengamanan Hutan

Tabel 12. Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/ Adaptasi	Tahun (2019-2028)	
				Sasaran	Cara Pencapaian
1.	**Penataan areal** Penandaan Batas	Km	8.5 Km	Dilaksanakan pada tahun 2021s /d 2022 dengan jarak lokasi keliling 9 Km dari total luasan 154,4 Ha	Penandaan batas sederhana
2.	**Konservasi**	Ha	12.8 Ha	DIlaksanakan pada tahun ke 1 s/d 10	Penanaman tanaman keras sengon dan randu pada tahun 2019 s/d 2028 dengan luas 154,4 ha
3.	**Pengamanan dan Perlindungan**				
	a. Pengamanan	Ha	154.4 Ha	Luas areal 154.4 Ha	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu
	b. Perlindungan	Ha	154.4 Ha	Tercapainya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berkelanjutan, bertanggung-jawab dengan mempertahankan kualitas lingkungan.	Memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir

2. Realisasi Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 13. Jenis kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)	-	Pembibitan jati sejumlah 4312 Batang petak 44,	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Penanaman (H)	Mitigasi	Penanaman Jati sebanyak 4312 batang seluas 4.9 Ha di petak 45	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)		pemeliharaan Jati sebanyak 4312 batang seluas 4.9 Ha di petak 45	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi	Tahun Ke 1-10	Keterangan
4	Pemanenan	-	-	-
5	Pengolahan	-	-	-
6	Pemasaran	-	-	-

3. Realisasi Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 14. Jenis kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)	-	sukun 15000 batang,petak 45 Kluwih 15000 petak 45 45,jagung 1000 kg petak 48	-
2	Penanaman (H)	Mitigasi	a. Penanaman Sukun sebanyak 15000 batang seluas 30 Ha di petak 45 b. Penanaman Kluwih sebanyak 15000 batang seluas 30 Ha di petak 45 c. Penanaman Jagung sebanyak 15000 kg seluas 102.5 Ha di petak 44,45,48 d. Penanaman jahe sebanyak 10000 kg seluas 100 Ha di petak 44,48 e. Penanamn Kunir sebanyak 10000 Kg seluas 100 Ha di petak 45	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)	Mitigasi	a. Pemeliharaan Sukun sebanyak 15000 batang seluas 30 Ha di petak 45 b. Pemeliharaan Kluwih sebanyak 15000 batang seluas 30 Ha di petak 45 c. Pemeliharaan Jagung sebanyak 15000 kg seluas 102.5 Ha di petak 44,45,48 d. pemeliharaan jahe sebanyak 10000 kg seluas 100 Ha di petak 44,48 e. pemeliharaan Kunir sebanyak 10000 Kg seluas 100 Ha di petak 45	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
4	Pemanenan	Adaptasi	a. Pemanenan Jagung sebanyak 153.000 kg seluas 102.5 Ha di petak 44,45,48	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
5	Pengolahan	-	a. pengolahan Jagung sebanyak 1500 kg b. pengolahan kunir sebayak 2500 kg c. pengolahan jahe sebanyak 2500 kg	-

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi	Tahun Ke 1-10	Keterangan
6	Pemasaran	Adaptasi	a. pemasaran Jagung sebanyak 15.000 kg b. pemasarann kunir sebayak 25000 kg c. pengolahan jahe sebanyak 25000 kg	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

4. Realisasi Pemanfaatan Kawasan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 15. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Tanaman Obat	-	-	-
2	Tanaman Hias	-	-	-
3	Jamur	-	-	-
4	Lebah madu	-	-	-
5	Perlindungan Satwa Liar	-	-	-
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	-	-	-
7	*Agroforestry*	-	-	-
8	*Silvopasture*	-	-	-
9	*Silvofishery*	-	-	-
10	*Agrosilvopasture*	-	-	-

5. Realisasi Pemanfaatan Kawasan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 16. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Tanaman Obat	-	-	-
2	Tanaman Hias	-	-	-
3	Jamur	-	-	-
4	Lebah madu	-	-	-
5	Perlindungan Satwa Liar	-	-	-
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	-	-	-
7	*Agroforestry*	-	-	-
8	*Silvopasture*	-	-	-
9	*Silvofishery*	-	-	-
10	*Agrosilvopasture*	-	-	-

6. Realisasi Pemanfaatan Kawasan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 17. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam	-	-	-
2	Jasa Tata Air	-	-	-
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	-

7. Realisasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 18. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam	-	-	-
2	Jasa Tata Air	-	-	-
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	-

8. Realisasi Penguatan Kelembagaan

Tabel 19. Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Pembentukan KUPS	-	-	-
2	Sekolah lapang	-	a. Fermentasi Pakan ternak b. Produksi pengolahan hasil tanaman semusim (Jagung)	tentatif
3	Studi berbanding	-	a. Fermentasi pakan ternak b. Produksi pengolahan hasil tanaman semusim (Jagung) c. Magang Pemandu wisata	tentatif
4	Penyusunan AD/ART	-	-	-
5	Pelatihan Teknis	-	-	-
6	Penyusunan Administrasi	-	-	-

9. Realisasi Pengembangan Usaha

Tabel 20. Jenis dan bentuk produk/jasa yang diusahakan

No	Jenis Komoditas	Volume	Bentuk Produk Pemasaran (Bahan Baku, Produk Turunan)	Harga
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-

Tabel 21. Realisasi Kegiatan Pengembangan Usaha

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Sertifikasi produk	-	-	-
2	Pengemasan Produk	-	-	-
3	Labeling Produk	-	-	-
4	Branding Produk	-	-	-
5	Indikasi Geografis Produk	-	-	-
6	Promosi Produk	-	-	-
7	Temu Usaha	-	-	-
8	Pameran Produk	-	-	-
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES	-	-	-
10	Akses Permodalan	-	-	-
11	Akses Pemasaran	-	-	-

10. Realisasi Kearifan Lokal

Tabel 22. Jenis kegiatan Kearifan Lokal.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	-	-	-	-

BAB IV
RENCANA KEGIATAN

Sasaran kegiatan Rencana Kelola Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan secara kuantitatif selama jangka 10 tahun secara rinci disajikan pada Tabel dibawah ini :

1. Konservasi, Perlidungan dan Pengamanan Hutan

Tabel 23. Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/ Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun I s/d X	
				Sasaran	Cara Pencapaian
1.	**Penataan areal** a. Penandaan Batas b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal	Km Ha	a. Penandaan batas luar sepanjang 8.500 meter b. Pembagian ruang perlindungan seluas 38 Ha dan ruang pemanfaatan seluas 133 Ha c. Penandaan batas andil garapan	Dilaksanakan pada tahun ke 1	a. Penandaan batas sederhana b. Pemberian tanda batas ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan c. Pembuatan batas andil garapan
2.	**Konservasi**	Ha	Pengayaan jenis tanaman energi dan MPTS pada ruang perlindungan	Dilaksanakan pada tahun ke 1 -10	a. Penanaman aren b. Hijauan pakan ternak c. Penanaman MPTS lainnya
3.	**Pengamanan dan Perlindungan**				
	a. Pengamanan	Ha	Kegiatan Patroli KTH Wono Dadi Lestari dalam angka pengamanan dan menjaga aset tegakan serta tanaman jenis lainya di lokasi Petak 44, 45,dan 48	Luas areal 151 Ha	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna
	b. Perlindungan	Ha	Penanaman hijauan pakan ternak serta menanam tanaman konservasi mpts	Tercapainya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berke-lanjutan,	Memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/ Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun I s/d X	
				Sasaran	Cara Pencapaian
				bertanggung-jawab dengan memper-tahankan kualitas lingkungan.	

2. Rencana Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 24. Jenis kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)	-	-	-
2	Penanaman (H)	Mitigasi	Penanaman, Sengon sejumlah 1.600 batang seluas 4 Ha di petak 45	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS/KTH Wono Dadi lestari
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)	Mitigasi	pemeliharaan, Sengon sejumlah 1.600 batang seluas 4 Ha di petak 45	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS/ KTH Wono Dadi lestari
4	Pemanenan	Adaptasi	Pemanenan sengon Sebanyak 240 m^3 seluas 4 Ha di petak 45	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS/ KTH Wono Dadi lestari
5	Pengolahan	-	-	-
6	Pemasaran	Adaptasi	Pemasaran hasil panen kayu sengon di Petak 45 sebanyak 240 m^3	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS/KTH Wono Dadi lestari

3. Rencana Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 25. Jenis kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)			
2	Penanaman (H)	Mitigasi	a. Penanaman Alpukat Sejumlah 8000 Batang seluas 20 Ha di petak 44 b. Penanaman Mangga gadung sejumlah 3.200 batang Seluas 3 Ha di petak 44 c. Penanaman Kopi Sebanyak 6.800 batang seluas 17 Ha di petak 45 d. Penanaman Alpukat sejumlah 1.600 batangs seluas 4 Ha di petak 48 e. Penanaman Sukun Sejumlah 1.600 Batang seluas 4 Ha di petak 48 f. Penaman Padi sejumlah 7,2 Ton seluas 90 ha di petak 44 g. Penanaman jagung sejumlah 0,56 Ton seluas 20 ha di petak 44 h. Penanaman Padi sejumlah 3,2 Ton seluas 40 ha di petak 45 i. Penanaman Jagung sejumlah 0,56 Ton seluas 20 ha di petak 45 j. Penanaman Padi sejumlah 4 Ton seluas 50 ha di petak 48	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS/ KTH Wono Dadi lestari
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)	Mitigasi	a. Pemeliharaan Alpukat Sejumlah 2.400 Batang seluas 20 Ha di petak 44 b. Pemeliharaan Mangga gadung sejumlah 940 batang seluas 8 Ha di petak 44 c. Pemeliharaan kopi sejumlah 2040 batang luas 17 Ha di petak 45 d. Pemeliharaan Alpukat sejumlah 480 batang luas 4 Ha di petak 48	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS/ KTH Wono Dadi lestari

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
			e. Pemeliharaan Sukun sejumlah 480 batang luas 4 Ha di petak 48	
4	Pemanenan	Adaptasi	a. Pemanenan Alpukat 35 Ton di petak 44 b. Pemanenan Mangga gadung 44,8 Ton di petak 44 c. Pemanenan Kopi 73,5 Ton di petak 45 d. Pemanenan alpukat 16 Ton di petak 48 e. Pemanenan Sukun 51,2 ton di petak 48 f. Pemanenan Padi 540 Ton di petak 44 g. Pemanenan jagung 160 Ton di petak 44 h. pemanenan Padi 240 ton di petak 45 i. Penanaman Jagung 160 ton di petak 45 j. Pemanenan padi 300 ton di petak 48	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS/ KTH Wono Dadi lestari
5	Pengolahan	-	-	-
6	Pemasaran	Adaptasi	a. Pemasaran Alpukat sejumlah 35 Ton b. Pemasaran Mangga gadung sejumlah 44,8 ton c. Pemasaran Kopi Sejumlah 73,5 ton d. Pemasaran Alpukat Sejumlah 16 Ton e. Pemasaran sukun sejumlah 51,2 Ton f. pemasaran Padi sejumlah 1080 ton g. Pemasaran Jagung sejumlah 320 ton	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS/ KTH Wono Dadi lestari

f. Rencana Pemanfaatan kawasan hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 26. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Tanaman Obat	Mitigasi	a. Jenis Jahe Jumlah 10000 Kg Lokasi Petak 44 b. Jenis Kunir Jumlah 10000 Kg Petak 45	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS/ KTH Wono Dadi lestari
2	Tanaman Hias	-	-	-
3	Jamur	-	-	-
4	Lebah madu	Mitigasi	Jenis Lebah Madu Jumlah 125 Setup Lokasi Petak 45	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS/ KTH Wono Dadi lestari
5	Perlindungan Satwa Liar	Adaptasi	Perlindungan Satwa Jenis Kera di Peta 48	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS/ KTH Wono Dadi lestari
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	Mitigasi	Penanaman Rumput gajah Jumlah 5400 ikat, Petak 45	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS/ KTH Wono Dadi lestari
7	*Agroforestry*	Mitigasi	Penanaman Sukun jumlah 5000 batang di petak 44	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS/ KTH Wono Dadi lestari
8	*Silvopasture*	-	a. Jumlah 135 Ekor, Jenis Sapi Petak 45 b. Jumlah 270 Ekor Jenis Kambing Petak 45	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS/ KTH Wono Dadi lestari
9	*Silvofishery*	-	-	-
10	*Agrosilvopasture*	-	-	-

g. Rencana Pemanfaatan kawasan hutan.

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 27. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Tanaman Obat	-	-	-
2	Tanaman Hias	-	-	-
3	Jamur	-	-	-
4	Lebah madu	-	-	-
5	Perlindungan Satwa Liar	-	-	-
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	-	-	-
7	*Agroforestry*	-	-	-
8	*Silvopasture*	-	-	-
9	*Silvofishery*	-	-	-
10	*Agrosilvopasture*	-	-	-

h. Rencana Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 28. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam	Mitigasi	Wisata Alam Agro Jenggrik Obyek kompilasi tanaman Kolam Renang, tempat kemah, Spot foto jembatan penyebrangan dan rest area parkir	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Jasa Tata Air	-	-	-
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	-

i. Realisasi Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 29. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam	-	-	-
2	Jasa Tata Air	-	-	-
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	-

j. Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel 30. Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Pembentukan KUPS	Adaptasi	a. Pembentukan KUPS Ternak Wono Dadi Lestari b. Pembentukan KUPS Agro Wono Dadi Lestari II	-
2	Sekolah lapang	Adaptasi	a. KUPS Ternak Wono Dadi Lestari I Jumlah 30 orang Jenis pelatihan Budidaya Pakan ternak Lokasi Tentatif Menyesuaikan b. KUPS Agro Wono Dadi Lestari II Jumlah 30 orang	-

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
			Jenis Pelatihan Pembuatan Pupuk Cair Bokashi Lokasi Tentatif Menyesuaikan	
3	Studi berbanding	Adaptasi	a. KUPS Ternak Wono Dadi Lestari I Jumlah 30 orang Jenis pelatihan Budidaya Pakan ternak Lokasi Tentatif Menyesuaikan b. KUPS Agro Wono Dadi Lestari II Jumlah 30 orang Jenis Pelatihan Pembuatan Pupuk Cair Bokashi Lokasi Tentatif Menyesuaikan	-
4	Penyusunan AD/ART	Adaptasi	Tahun ke 1 akan dilakukan penyusunan AD/ART	-
5	Pelatihan Teknis	Adaptasi	a. KUPS Agro Wono Dadi Lestari I Jumlah 5 orang jenis pelatihan Peningkatan SDM Petani Lokasi Tentatif menyesuaiakan b. KUPS Ternak Wono Dadi Lestari II Jumlah 5 Orang Jenis pelatihan Peningkatan SDM Petani Tentatif	-
6	Penyusunan Administrasi	Adaptasi	-	-

k. Rencana Pengembangan Usaha

Tabel 31. Jenis dan bentuk produk/jasa yang diusahakan

NO	JENIS KOMODITAS	VOLUME	BENTUK PRODUK PEMASARAN (bahan baku, produk turunan)	HARGA
1	Wisata Alam Agro	100	Wisata Alam Agro Jenggrik	Rp.10.000 / orang
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Tabel 32. Rencana Kegiatan Pengembangan Usaha


No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Sertifikasi produk	-	-	-
2	Pengemasan Produk	-	-	-
3	Labeling Produk	-	-	-
4	Branding Produk	-	-	-

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
5	Indikasi Geografis Produk	-	-	-
6	Promosi Produk	-	-	-
7	Temu Usaha	-	-	-
8	Pameran Produk	-	-	-
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES	-	-	-
10	Akses Permodalan	-	-	-
11	Akses Pemasaran	-	-	-
12	Dst	-	-	-

I. Rencana Kearifan Lokal

Tabel 33. Jenis kegiatan Kearifan Lokal.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Selamatan Setelah Tanam	Adaptasi	Selamatan dan kendurian	Tradisi Ngelampet selamatan setelah Tanam

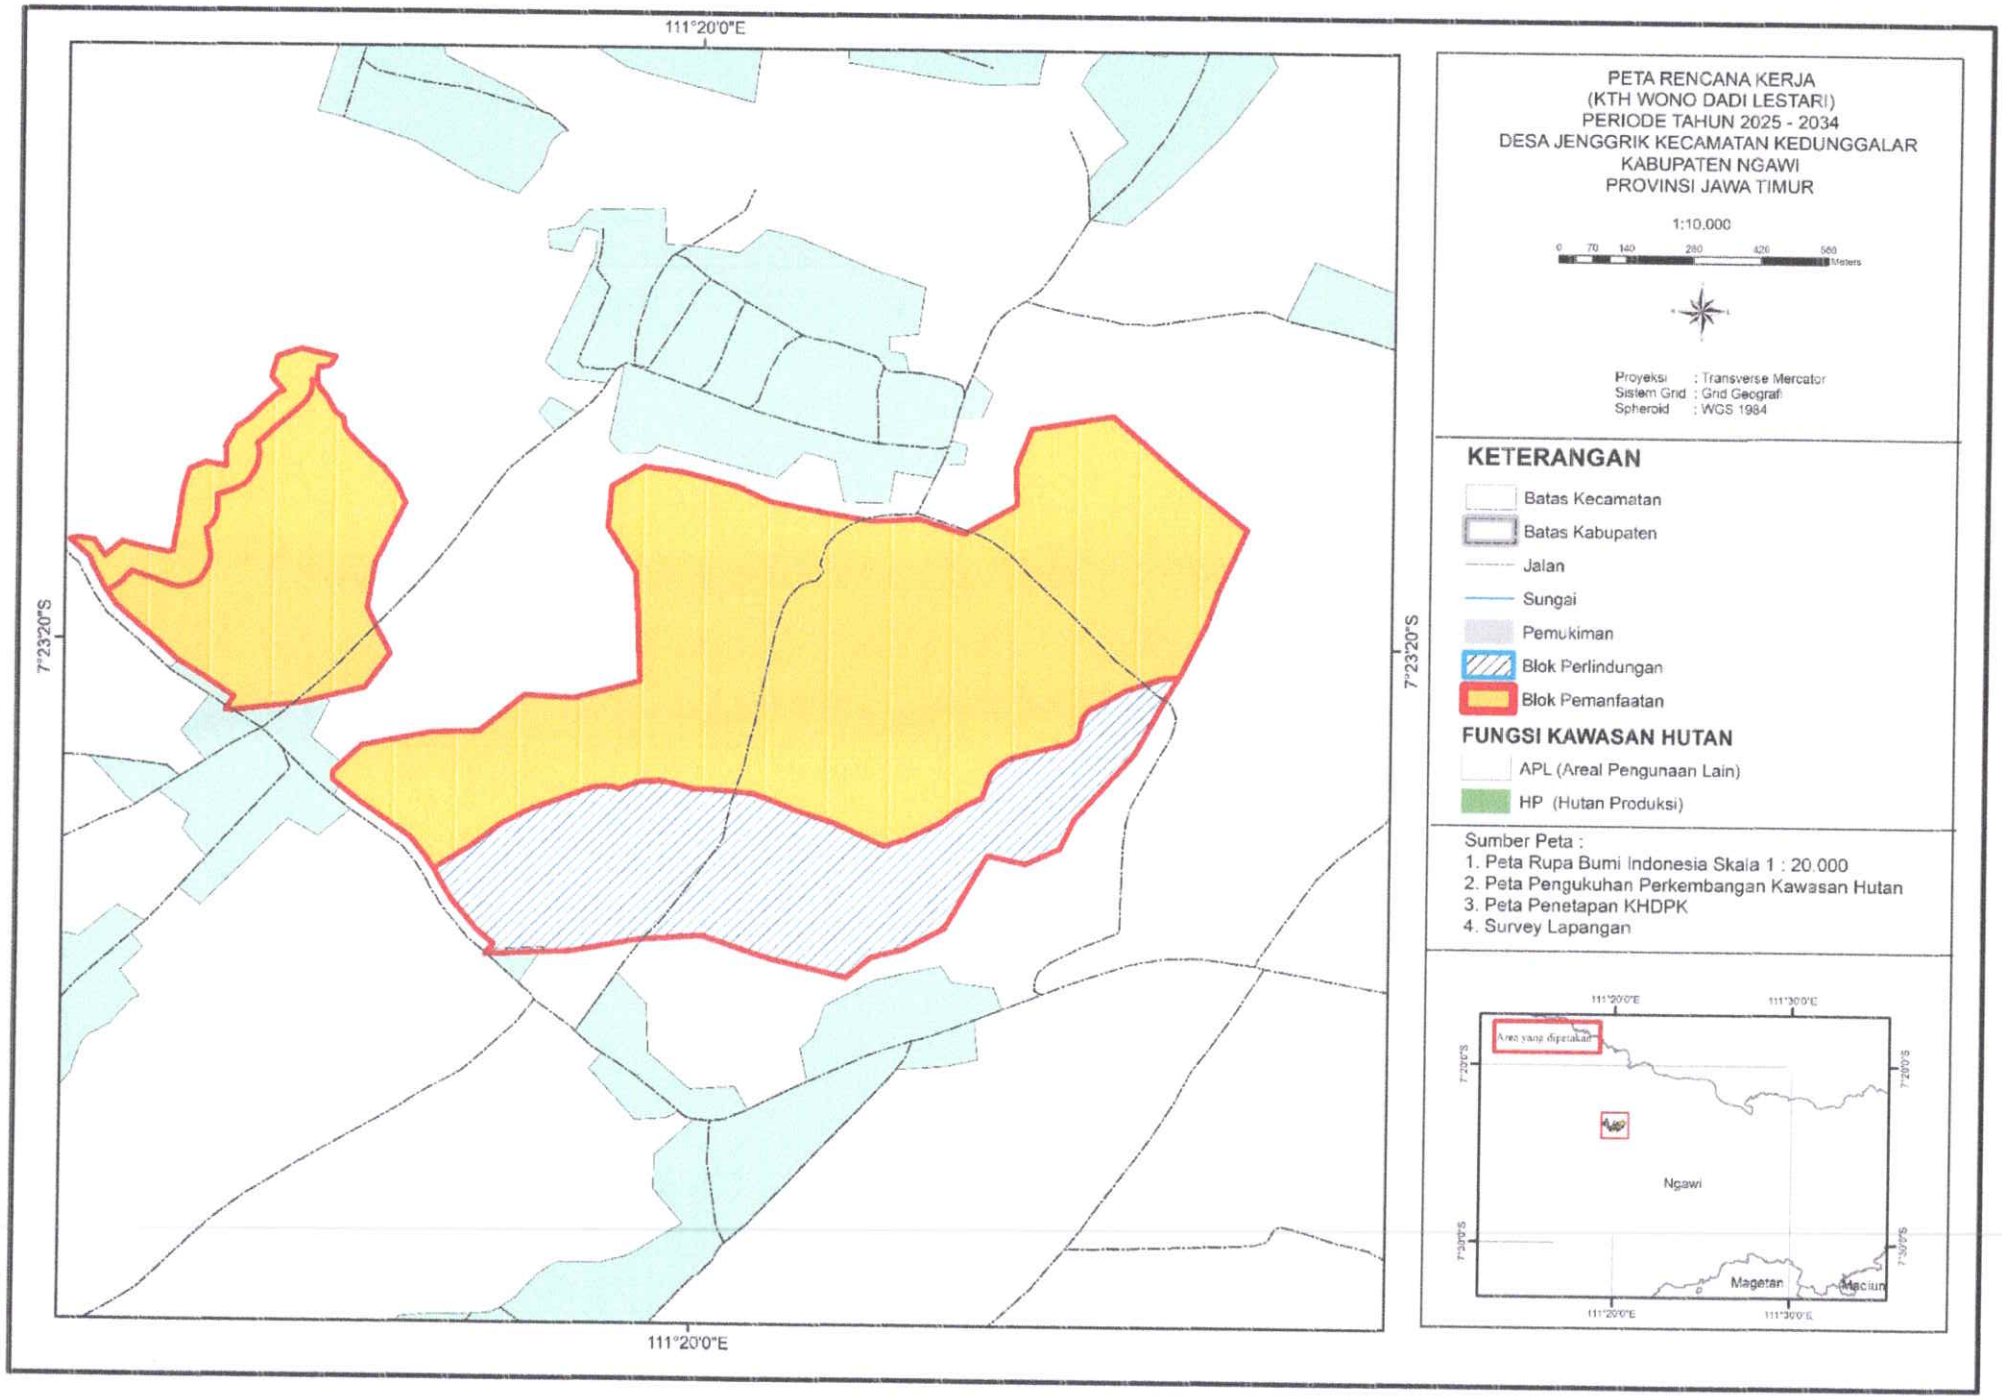

PETA RENCANA KERJA
(KTH WONO DADI LESTARI)
PERIODE TAHUN 2025 - 2034
DESA JENGGRIK KECAMATAN KEDUNGGALAR
KABUPATEN NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

1:10.000

0 70 140 280 420 560 Meters

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN

- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Jalan
- Sungai
- Pemukiman
- Blok Perlindungan
- Blok Pemanfaatan

FUNGSI KAWASAN HUTAN

- APL (Areal Pengunaan Lain)
- HP (Hutan Produksi)

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 20.000
2. Peta Pengukuhan Perkembangan Kawasan Hutan
3. Peta Penetapan KHDPK
4. Survey Lapangan

BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Kelola Perhutanan Sosial pada Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan kemasyarakatan KTH Wono Dadi Lestari Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar untuk Periode tahun 2025. s/d 2034 di Kabpuaten Ngawi Provinsi Jawa Timur disusun, diharapkan dapat menjadi acuan sekaligus pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan pengelolaan Areal Perhutanan Sosial.
